Generalsanierung
Hohenstaufen-
Gymnasium

Vorabzug

dasch zürn + partner
Index 00/[Fre 24.04.26atum]/dzpa

Rahmenterminplan

Nr.	Vorgangs/Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
1	Weihnachten 2026-2027	1 Tag	Don 24.12.26	Fre 08.01.27		
2	Weihnachten 2027-2028	1 Tag	Die 01.10.24	Die 01.10.24		
3	Abitur schriftlich	2 Tage	Mit 22.04.26	Don 23.04.26		
4	Abitur schriftlich	2 Tage	Mon 27.04.26	Die 28.04.26		
5	Abitur schriftlich	1 Tag	Don 30.04.26	Don 30.04.26		
6	Abitur schriftlich	1 Tag	Mit 06.05.26	Mit 06.05.26		
7	Abitur mündlich	2 Tage	Don 02.07.26	Fre 03.07.26		
8	Fördertermine Fristen	928 Tage	Don 30.04.26	Mon 24.12.29		
9	LAD 1.BA Abschluss Bauleistung	1 Tag	Don 16.12.27	Don 16.12.27		
10	LAD 1.BA Abrechnung	1 Tag	Fre 22.12.28	Fre 22.12.28		
11	LAD 2.BA Abschluss Bauleistung	1 Tag	Fre 05.05.28	Fre 05.05.28		
12	LAD 2.BA Abrechnung	1 Tag	Mon 24.12.29	Mon 24.12.29		
13	DSD 1.BA Abschluss Bauleistung	1 Tag	Don 30.04.26	Don 30.04.26		
14	DSD 1.BA Abrechnung	1 Tag	Fre 30.10.26	Fre 30.10.26		
15	Denkmalschutz-Sonderprogramm XI 1.+2.BA Abrechnung	1 Tag	Don 16.12.27	Don 16.12.27		
16	Dt. Stiftung BW Schreiner Möbel Abschluss Bauleistung	1 Tag	Fre 26.06.26	Fre 26.06.26		
17	1.Bauabschnitt	387 Tage	Mon 21.07.25	Don 18.02.27		
282	2.Bauabschnitt Südtrakt	267 Tage?	Mon 03.08.26	Fre 27.08.27		
283	Werkplanung Planer	100 Tage	Mon 16.03.26	Fre 31.07.26		
284	VE 3.1.01 Rohbau	227 Tage	Mon 03.08.26	Fre 02.07.27		
285	BE Umbau Baustelleneinrichtung, Bauzaun	10 Tage	Mon 03.08.26	Fre 14.08.26		
286	Schutzabdeckungen Innenbereich ST	10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26		
287	Rückbauarbeiten innen+ Rückbau HLS/E ST	30 Tage	Mon 31.08.26	Fre 09.10.26		
288	Dachkonstruktionsarbeiten ST	40 Tage	Mon 31.08.26	Fre 23.10.26		
289	Dachkonstruktionsarbeiten Verb.gang Süd	40 Tage	Mon 31.08.26	Fre 23.10.26		
290	Mauerarbeiten ST	15 Tage	Mon 11.01.27	Fre 29.01.27		
291	Restarbeiten	10 Tage	Mon 03.05.27	Fre 14.05.27		
292	Baucontainerrückbau	15 Tage	Mon 14.06.27	Fre 02.07.27		
293	Kranrückbau	10 Tage	Mon 26.04.27	Fre 07.05.27		
294	VE 3.2.01 ELT/Daten	252 Tage	Mon 17.08.26	Fre 20.08.27		
295	Sicherungsmaßnahmen, Rückbau Bauteile	10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26		
296	Rohmontage	60 Tage	Mon 12.10.26	Mit 20.01.27		
297	Fertiginstallation	30 Tage	Mon 12.07.27	Fre 20.08.27		
298	VE 3.2.02 Sanitär	257 Tage	Mon 17.08.26	Fre 27.08.27		
299	Sicherungsmaßnahmen, Rückbau Bauteile	10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26		
300	Rohmontage	60 Tage	Mon 12.10.26	Mit 20.01.27		
301	Fertiginstallation	30 Tage	Mon 19.07.27	Fre 27.08.27		
302	VE 3.2.03 Heizung	247 Tage	Mon 17.08.26	Fre 13.08.27		
303	Rückbau Heizkörper	10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26		
304	Rohinstallation	60 Tage	Mon 12.10.26	Mit 20.01.27		
305	Fertigmontage	20 Tage	Mon 19.07.27	Fre 13.08.27		
306	VE 3.2.04 Lüftung	197 Tage	Mon 26.10.26	Fre 13.08.27		
307	Rohinstallation	40 Tage	Mon 26.10.26	Fre 18.12.26		
308	Fertiginstallation	15 Tage	Mon 05.07.27	Fre 23.07.27		
309	Inbetriebnahme	10 Tage	Mon 02.08.27	Fre 13.08.27		
310	VE 4.1 Betonarbeiten (Sichtbetonsanierung)	30 Tage	Mon 31.08.26	Fre 09.10.26		
311	Ausführung Betonarbeiten ST, Verb.gänge Süd	30 Tage	Mon 31.08.26	Fre 09.10.26		
312	VE 4.2 Gerüst	185 Tage	Mon 17.08.26	Don 20.05.27		
313	Gerüstaufbau	10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26		
314	Gerüststandzeit	147 Tage	Mon 31.08.26	Fre 09.04.27		
315	Gerüstabbau	10 Tage	Mon 12.04.27	Fre 23.04.27		
316	VE 4.3 Dacharbeiten	60 Tage	Mon 07.09.26	Fre 27.11.26		
317	Dachdämmung, Dachabdichtung ST	40 Tage	Mon 07.09.26	Fre 30.10.26		
318	PV-Anlage (EVF)	15 Tage	Mon 02.11.26	Fre 20.11.26		
319	Bekiesung ST	5 Tage	Mon 23.11.26	Fre 27.11.26		
320	Dachdämmung, -abdichtung, Ext. Begrünung Verb.gang Süd	60 Tage	Mon 07.09.26	Fre 27.11.26		
321	VE 4.4 Fassadenarbeiten	147 Tage	Mon 31.08.26	Fre 09.04.27		
322	Ausführung Fenster ST 1.OG	25 Tage	Mon 31.08.26	Fre 02.10.26		
323	Ausführung Fenster ST EG	25 Tage	Mon 14.09.26	Fre 16.10.26		
324	Ausführung Fenster ST 1.UG	25 Tage	Mon 28.09.26	Fre 30.10.26		
325	Ausführung Fenstertüren EG Nord	10 Tage	Mon 02.11.26	Fre 13.11.26		
326	BriseSoleil	10 Tage	Mon 02.11.26	Fre 13.11.26		
327	Trhs. Süd Ost	25 Tage	Mon 12.10.26	Fre 13.11.26		
328	Trhs. Süd West	25 Tage	Mon 26.10.26	Fre 27.11.26		
329	Frostperiode	50 Tage	Die 01.12.26	Don 25.02.27		
330	Verb.gang 1.OG	30 Tage	Mon 01.03.27	Fre 09.04.27		
331	Verb.gang EG	20 Tage	Mon 15.03.27	Fre 09.04.27		
332	VE 4.5 Trockenbau (Innendämmung,-putz)	60 Tage	Mon 11.01.27	Fre 02.04.27		
333	Innendämmarbeiten	30 Tage	Mon 11.01.27	Fre 19.02.27		
334	Nassputz	15 Tage	Mon 01.02.27	Fre 19.02.27		
335	Trockenbau Wände	10 Tage	Mon 22.02.27	Fre 05.03.27		
336	Trockenbau Decken	30 Tage	Mon 22.02.27	Fre 02.04.27		
337	VE 5.9.1 Fachraumarbeiten/Fachklassenausstattung NWT	137 Tage	Mon 07.12.26	Fre 02.07.27		
338	Vormontage	5 Tage	Mon 07.12.26	Fre 11.12.26		
339	Ausführung Fachraumarbeiten/Fachklassen NWT	60 Tage	Mon 12.04.27	Fre 02.07.27		
340	VE 5.9.2 Fachraumarbeiten Bestandseinrichtung Physik	137 Tage	Mon 07.12.26	Fre 02.07.27		
341	Vormontage	5 Tage	Mon 07.12.26	Fre 11.12.26		
342	Ausführung Fachraumarbeiten Bestand Physik	60 Tage	Mon 12.04.27	Fre 02.07.27		
343	VE 4.8 Gebäudeautomation	142 Tage	Mon 09.11.26	Fre 11.06.27		
344	Rohinstallation	30 Tage	Mon 09.11.26	Fre 18.12.26		
345	Ausführung Gebäudeautomation	30 Tage	Mon 03.05.27	Fre 11.06.27		
346	VE 4.9 Blitzschutz	20 Tage	Mon 23.11.26	Fre 18.12.26		
347	Ausführung Blitzschutz	10 Tage	Mon 23.11.26	Fre 04.12.26		
348	Potentialausgleich (vor Aussenanlagen)	10 Tage	Mon 07.12.26	Fre 18.12.26		
349	VE 5.1 Fliesen-/Plattenarbeiten	20 Tage	Mon 18.01.27	Fre 12.02.27		
350	Ausführung Fliesen	20 Tage	Mon 18.01.27	Fre 12.02.27		
351	VE 5.2 Tischlerarbeiten 1 (Möbel)	197 Tage	Mon 31.08.26	Fre 18.06.27		
352	Ausführung Tischler Möbel Rückbau	10 Tage	Mon 31.08.26	Fre 11.09.26		
353	Ausführung Tischler Möbel, Sockelkanal	25 Tage	Mon 17.05.27	Fre 18.06.27		
354	VE 5.3 Tischlerarbeiten 2 (Türen)	172 Tage	Mon 31.08.26	Fre 14.05.27		
355	Ausführung Tischler Türen Rückbau/Sicherung	5 Tage	Mon 31.08.26	Fre 04.09.26		
356	Ausführung Tischler Türen	10 Tage	Mon 03.05.27	Fre 14.05.27		
357	VE 5.4.2 Bodenbelag / Linoleum	45 Tage	Mon 15.03.27	Fre 14.05.27		
358	Ausführung Linoleum	35 Tage	Mon 15.03.27	Fre 30.04.27		
359	Sockelleisten	10 Tage	Mon 03.05.27	Fre 14.05.27		
360	VE 5.5 Metallbau 2 (Schlosser)	30 Tage	Mon 05.04.27	Fre 14.05.27		
361	Ausführung Schlosser Treppengeländer	30 Tage	Mon 05.04.27	Fre 14.05.27		
362	VE 5.6 Maler	40 Tage	Mon 03.05.27	Fre 25.06.27		
363	Ausführung Maler HT	40 Tage	Mon 03.05.27	Fre 25.06.27		
364	VE 5.7 Blendschutz	25 Tage	Mon 03.05.27	Fre 04.06.27		
365	Ausführung Blendschutz	25 Tage	Mon 03.05.27	Fre 04.06.27		
366	VE 5.8 Decken (Eternit-Decken Aussenbereich)	90 Tage	Mon 26.04.27	Fre 27.08.27		
367	Deckenuntersichten HT, Verbindungsgänge	90 Tage	Mon 26.04.27	Fre 27.08.27		
368	VE 5.10.02 Instandsetzung Innenhofplatten	140 Tage	Mon 15.02.27	Fre 27.08.27		
369	Instandsetzung / Sanierung innenhofplatten	80 Tage	Mon 15.02.27	Fre 04.06.27		
370	Ausführung Einbau Innenhofplatten Atrium	90 Tage	Mon 26.04.27	Fre 27.08.27		
371	VE 5.10.03 Landschaftsbau / Sportplatzsanierung	60 Tage	Mon 05.07.27	Fre 24.09.27		
372	Ausführung Landschaftsbau Teil 2	60 Tage	Mon 05.07.27	Fre 24.09.27		
373	VE 5.11 Holzfenster	10 Tage	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26		
374	Ausführung Holzfenster	10 Tage	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26		
375	Ausstattung Klassenzimmer (GP)	20 Tage	Mon 09.08.27	Fre 03.09.27		
376	VE 6.1 Beschilderung/Signaletik	10 Tage	Mon 28.06.27	Fre 09.07.27		
377	Ausführung Beschilderung	10 Tage	Mon 28.06.27	Fre 09.07.27		
378	VE 6.2 Baureinigung	20 Tage	Mon 21.06.27	Fre 16.07.27		
379	Ausführung Baureinigung	20 Tage	Mon 21.06.27	Fre 16.07.27		
380	Feuerlöschgeräte (GP)	5 Tage	Mon 05.07.27	Fre 09.07.27		
381	VE 5.5.02 Schließanlage	5 Tage	Mon 05.07.27	Fre 09.07.27		
382	Nutzertechnik, IT-Technik Fachbereich GP	20 Tage	Mon 07.06.27	Fre 02.07.27		
383	BRA Vorbegehung	1 Tag	Fre 16.07.27	Fre 16.07.27		
384	Abnahmen, Mängelbeseitigung	19 Tage	Mon 19.07.27	Don 12.08.27		
385	BRA Abnahme	1 Tag	Fre 13.08.27	Fre 13.08.27		
386	Puffer	19 Tage	Mon 16.08.27	Don 09.09.27		
387	Übergabe an Nutzer	1 Tag	Fre 10.09.27	Fre 10.09.27		
388	Umzug Schule von Interim zu Südtrakt	10 Tage	Mon 13.09.27	Fre 24.09.27		
389	3.Bauabschnitt Sportplatzsanierung	50 Tage	Mon 03.04.28	Fre 09.06.28		
390	VE 5.10.03 Landschaftsbau / Sportplatzsanierung Sportplatzsanierung (außerhalb Frostperiode!)	50 Tage	Mon 01.03.27	Fre 07.05.27		

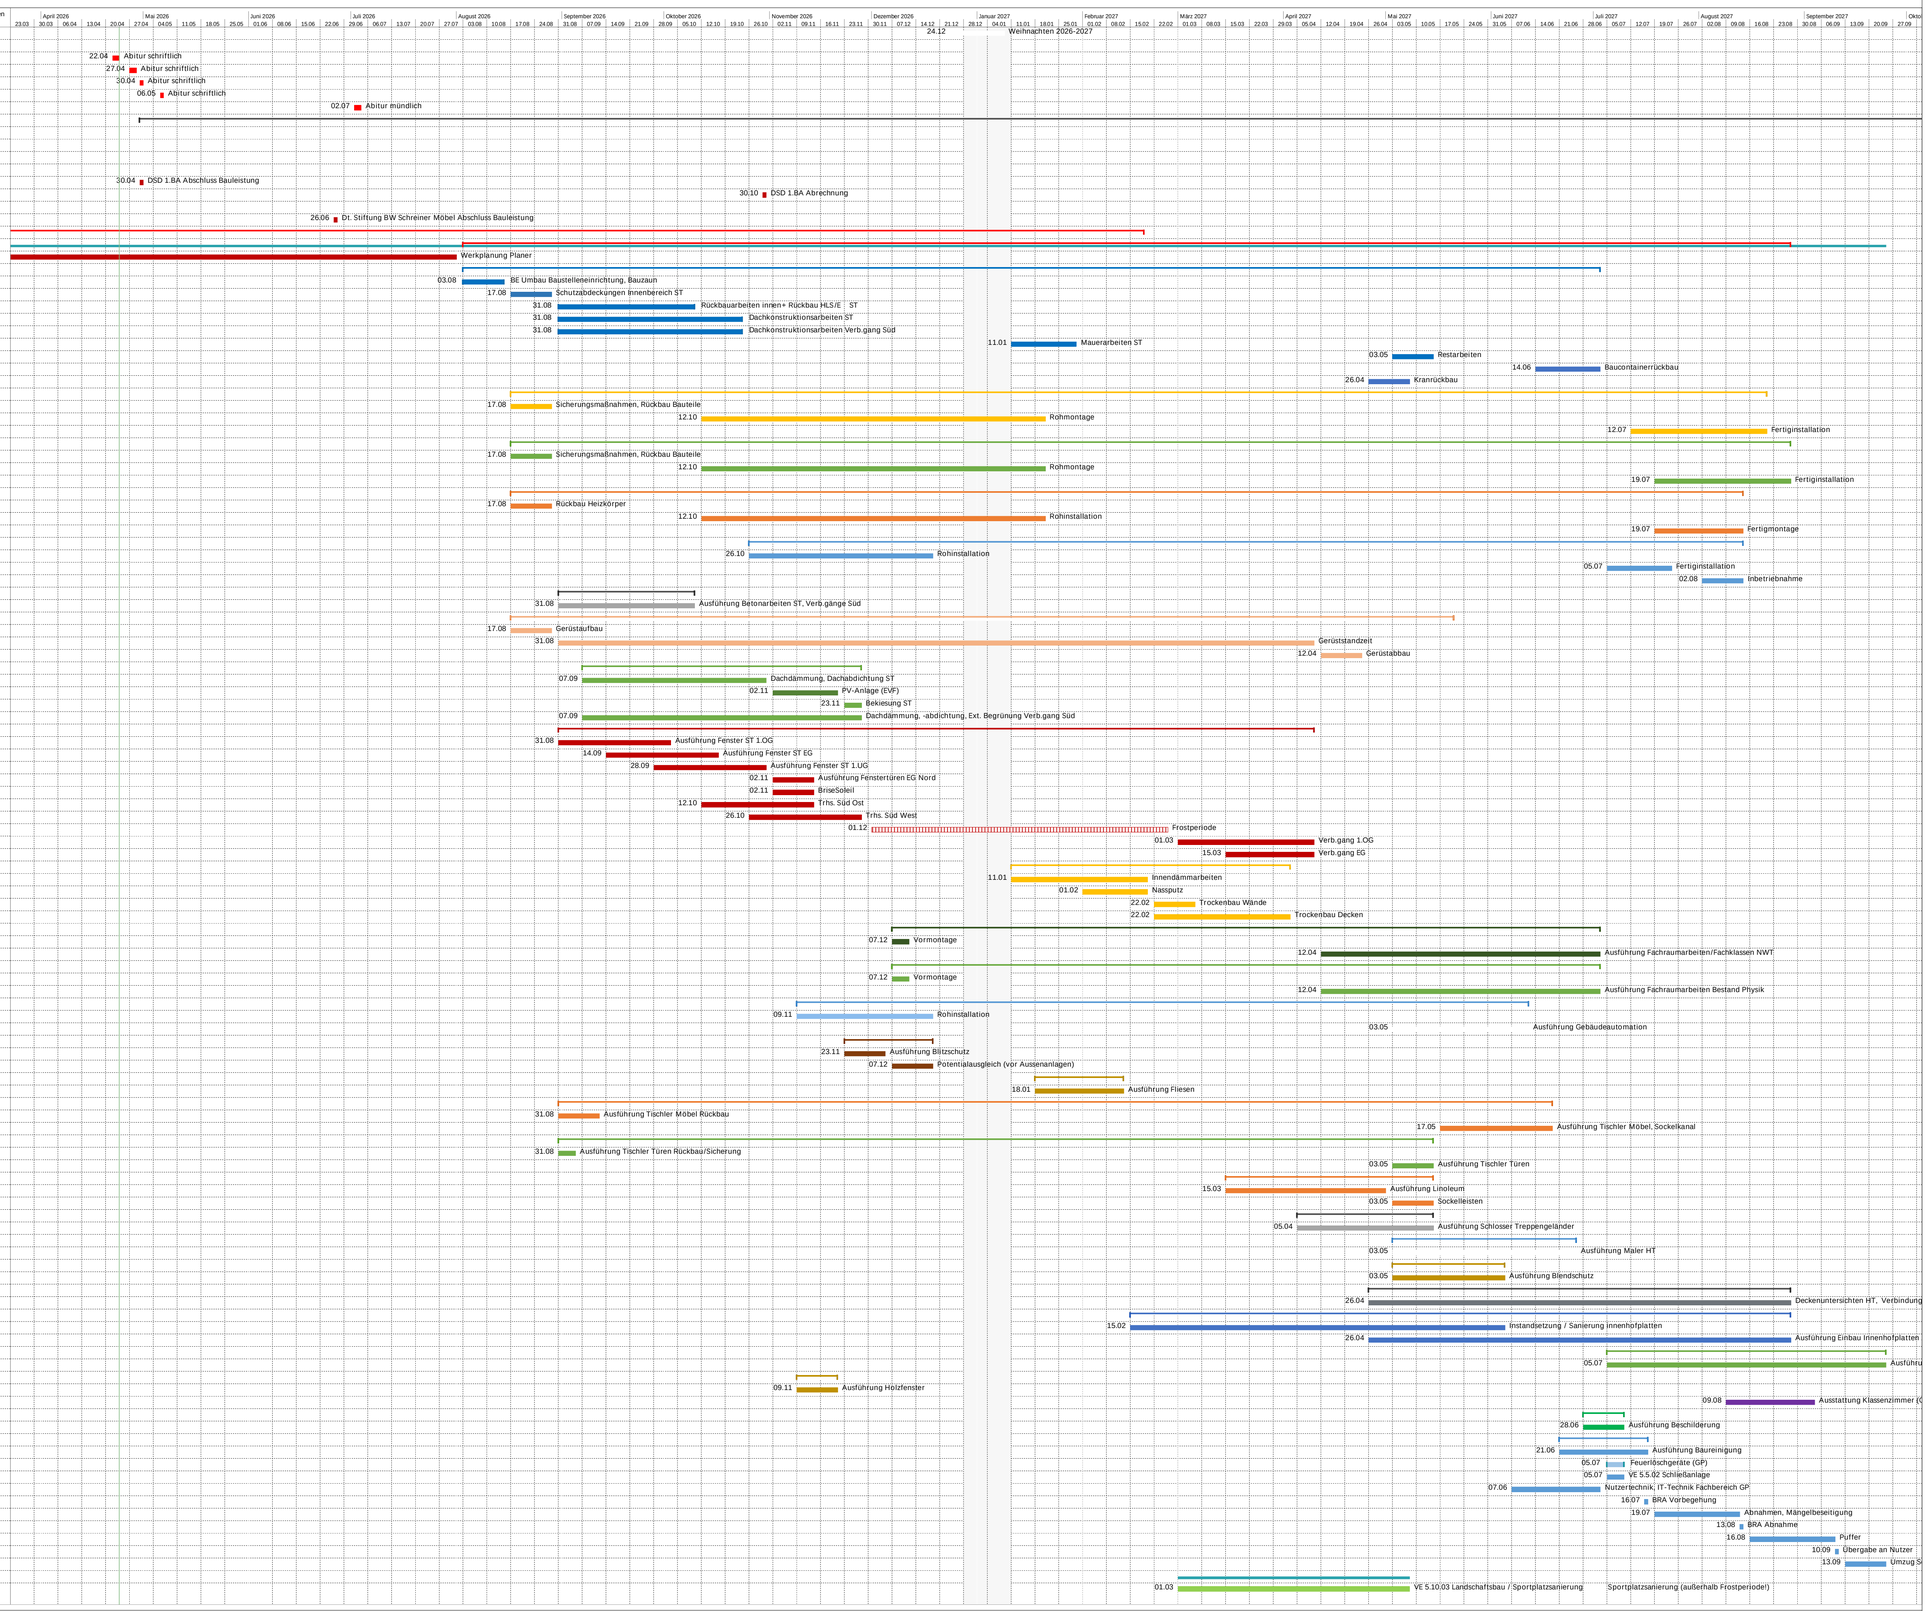

Projekt: 241001_HoGy_Gewerk
Datum: Fre 24.04.26

Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelrollup | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Stichtag | In Arbeit | Manueller Fortschritt
