
Generalsanierung
Hohenstaufen-
Gymnasium

Bauabschnitt 2

dasch zürn + partner
Index 01/[Die 14.07.26atum]/dtpa

Rahmenterminplan BA2

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
1	Weihnachten 2026-2027	1 Tag	Don 24.12.26	Fre 08.01.27		
2	Weihnachten 2027-2028	1 Tag	Die 01.10.24	Die 01.10.24		
3	Fördertermine Fristen	928 Tage	Don 30.04.26	Mon 24.12.29		
4	LAD 1.BA Abschluss Bauleistung	1 Tag	Don 16.12.27	Don 16.12.27		
5	LAD 1.BA Abrechnung	1 Tag	Fre 22.12.28	Fre 22.12.28		
6	LAD 2.BA Abschluss Bauleistung	1 Tag	Fre 05.05.28	Fre 05.05.28		
7	LAD 2.BA Abrechnung	1 Tag	Mon 24.12.29	Mon 24.12.29		
8	DSD 1.BA Abschluss Bauleistung	1 Tag	Don 30.04.26	Don 30.04.26		
9	DSD 1.BA Abrechnung	1 Tag	Fre 30.10.26	Fre 30.10.26		
10	Denkmalschutz-Sonderprogramm XI 1.+2.BA Abrechnung	1 Tag	Don 16.12.27	Don 16.12.27		
11	Dt. Stiftung BW Schreiner Möbel Abschluss Bauleistung	1 Tag	Fre 26.06.26	Fre 26.06.26		
12	1.Bauabschnitt	387 Tage	Mon 21.07.25	Don 18.02.27		
277	2.Bauabschnitt Südtrakt	267 Tage	Mon 03.08.26	Fre 27.08.27		
278	Werkplanung Planer	100 Tage	Mon 16.03.26	Fre 31.07.26		
279	Umzug Südtrakt - Haus der Jugend	10 Tage	Mon 20.07.26	Fre 31.07.26		
280	VE 3.1.01 Rohbau	227 Tage	Mon 03.08.26	Fre 02.07.27		
281	BE Umbau Baustelleneinrichtung, Bauzaun	5 Tage	Mon 03.08.26	Fre 07.08.26	279	
282	Schutzabdeckungen Innenbereich ST	10 Tage	Mon 10.08.26	Fre 21.08.26		
283	Rückbauarbeiten innen+ Rückbau HLS/E ST	30 Tage	Mon 24.08.26	Fre 02.10.26	282	
284	Rückbau Kies+Begrünung Dach ST + Verbindungsgänge	10 Tage	Mon 10.08.26	Fre 21.08.26		
285	Dachkonstruktionsarbeiten ST	40 Tage	Mon 24.08.26	Fre 16.10.26	317	
286	Dachausschnitt Verb.gang Dachausstieg	5 Tage	Mon 31.08.26	Fre 04.09.26		
287	Kontrollschachtsanierung 2.UG	10 Tage	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26		
288	Dachkonstruktionsarbeiten Verb.gang Süd	40 Tage	Mon 31.08.26	Fre 23.10.26		
289	Mauerarbeiten ST	15 Tage	Mon 11.01.27	Fre 29.01.27		
290	Restarbeiten	10 Tage	Mon 03.05.27	Fre 14.05.27		
291	Baucontainerrückbau	15 Tage	Mon 14.06.27	Fre 02.07.27		
292	Kranrückbau	10 Tage	Mon 26.04.27	Fre 07.05.27		
293	VE 3.2.01 ELT / Daten	264 Tage	Don 30.07.26	Fre 20.08.27		
294	Medienfrei schalten / Abklemmarbeiten	2 Tage	Don 30.07.26	Fre 31.07.26		
295	Sicherungsmaßnahmen, Rückbau Bauteile	10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26		
296	Rohmontage	60 Tage	Mon 12.10.26	Mit 20.01.27		
297	Fertiginstallation	30 Tage	Mon 12.07.27	Fre 20.08.27		
298	VE 3.2.02 Sanitär	269 Tage	Don 30.07.26	Fre 27.08.27		
299	Medienfrei schalten / Abklemmarbeiten	2 Tage	Don 30.07.26	Fre 31.07.26		
300	Sicherungsmaßnahmen, Rückbau Bauteile	10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26		
301	Rohmontage	60 Tage	Mon 12.10.26	Mit 20.01.27		
302	Fertiginstallation	30 Tage	Mon 19.07.27	Fre 27.08.27		
303	VE 3.2.03 Heizung	259 Tage	Don 30.07.26	Fre 13.08.27		
304	Medienfrei schalten / Abklemmarbeiten	2 Tage	Don 30.07.26	Fre 31.07.26		
305	Rückbau Heizkörper	10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26		
306	Rohinstallation	60 Tage	Mon 12.10.26	Mit 20.01.27		
307	Fertigmontage	20 Tage	Mon 19.07.27	Fre 13.08.27		
308	VE 3.2.04 Lüftung	259 Tage	Don 30.07.26	Fre 13.08.27		
309	Medienfrei schalten / Abklemmarbeiten	2 Tage	Don 30.07.26	Fre 31.07.26		
310	Rohinstallation	40 Tage	Mon 26.10.26	Fre 18.12.26		
311	Fertiginstallation	15 Tage	Mon 05.07.27	Fre 23.07.27		
312	Inbetriebnahme	10 Tage	Mon 02.08.27	Fre 13.08.27		
313	VE 4.1 Betonarbeiten (Sichtbetonsanierung)	45 Tage	Mon 10.08.26	Fre 09.10.26		
314	Betonsanierung HT Sternwarte, Ausdehnungskuppeln	10 Tage	Mon 10.08.26	Fre 21.08.26		
315	Ausführung Betonarbeiten ST, Verb.gänge Süd	35 Tage	Mon 24.08.26	Fre 09.10.26		
316	VE 4.2 Gerüst	186 Tage	Mon 17.08.26	Don 20.05.27		
317	Gerüstaufbau	10 Tage	Mon 10.08.26	Fre 21.08.26	281	
318	Aufbau Bauaufzug	5 Tage	Mon 24.08.26	Fre 28.08.26		
319	Gerüststandzeit	152 Tage	Mon 24.08.26	Fre 09.04.27		
320	Gerüstabbau	10 Tage	Mon 12.04.27	Fre 23.04.27		
321	VE 4.3 Dacharbeiten	65 Tage	Mon 31.08.26	Fre 27.11.26		
322	Dachdämmung, Dachabdichtung ST	40 Tage	Mon 31.08.26	Fre 23.10.26		
323	PV-Anlage UK (EVF)	5 Tage	Mon 26.10.26	Fre 30.10.26		
324	Bekiesung ST	5 Tage	Mon 02.11.26	Fre 06.11.26		
325	PV-Anlage Paneele (EVF)	10 Tage	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26		
326	Dachdämmung, -abdichtung, Ext. Begrünung Verb.gang Süd	60 Tage	Mon 07.09.26	Fre 27.11.26		
327	VE 4.4 Fassadenarbeiten	147 Tage	Mon 31.08.26	Fre 09.04.27		
328	Ausführung Fenster ST 1.OG	25 Tage	Mon 31.08.26	Fre 02.10.26		
329	Ausführung Fenster ST EG	25 Tage	Mon 14.09.26	Fre 16.10.26		
330	Ausführung Fenster ST 1.UG	25 Tage	Mon 28.09.26	Fre 30.10.26		
331	Ausführung Fenstertüren EG Nord	10 Tage	Mon 02.11.26	Fre 13.11.26		
332	BriseSoleil	10 Tage	Mon 02.11.26	Fre 13.11.26		
333	Trhs. Süd Ost	25 Tage	Mon 12.10.26	Fre 13.11.26		
334	Trhs. Süd West	25 Tage	Mon 26.10.26	Fre 27.11.26		
335	Frostperiode	50 Tage	Die 01.12.26	Don 25.02.27		
336	Verb.gang 1.OG	30 Tage	Mon 01.03.27	Fre 09.04.27		
337	Verb.gang EG	20 Tage	Mon 15.03.27	Fre 09.04.27		
338	VE 4.6 Trockenbau (Innendämmung, -putz)	60 Tage	Mon 11.01.27	Fre 02.04.27		
339	Innendämmarbeiten	30 Tage	Mon 11.01.27	Fre 19.02.27		
340	Nassputz	15 Tage	Mon 01.02.27	Fre 19.02.27		
341	Trockenbau Wände	10 Tage	Mon 22.02.27	Fre 05.03.27		
342	Trockenbau Decken	30 Tage	Mon 22.02.27	Fre 02.04.27		
343	VE 5.9.1 Fachraumarbeiten/Fachklassenausstattung NWT	227 Tage	Mon 03.08.26	Fre 02.07.27		
344	Vormontage	5 Tage	Mon 07.12.26	Fre 11.12.26		
345	Ausführung Fachraumarbeiten/Fachklassen NWT	60 Tage	Mon 12.04.27	Fre 02.07.27		
346	VE 5.9.2 Fachraumarbeiten Bestandseinrichtung Physik	227 Tage	Mon 03.08.26	Fre 02.07.27		
347	Demontage Physiktische, einlagern	5 Tage	Mon 03.08.26	Fre 07.08.26		
348	Vormontage	5 Tage	Mon 07.12.26	Fre 11.12.26		
349	Ausführung Fachraumarbeiten Bestand Physik	60 Tage	Mon 12.04.27	Fre 02.07.27		
350	VE 4.8 Gebäudeautomation	142 Tage	Mon 09.11.26	Fre 11.06.27		
351	Rohinstallation	30 Tage	Mon 09.11.26	Fre 18.12.26		
352	Ausführung Gebäudeautomation	30 Tage	Mon 03.05.27	Fre 11.06.27		
353	VE 4.9 Blitzschutz	20 Tage	Mon 23.11.26	Fre 18.12.26		
354	Ausführung Blitzschutz	10 Tage	Mon 23.11.26	Fre 04.12.26		
355	Potentialausgleich (vor Aussenanlagen)	10 Tage	Mon 07.12.26	Fre 18.12.26		
356	VE 5.1 Fliesen-/Plattenarbeiten	20 Tage	Mon 18.01.27	Fre 12.02.27		
357	Ausführung Fliesen	20 Tage	Mon 18.01.27	Fre 12.02.27		
358	VE 5.2 Tischlerarbeiten 1 (Möbel)	217 Tage	Mon 03.08.26	Fre 18.06.27		
359	Ausführung Tischler Möbel Rückbau	10 Tage	Mon 03.08.26	Fre 14.08.26		
360	Ausführung Tischler Möbel, Sockelkanal	35 Tage	Mon 03.05.27	Fre 18.06.27		
361	VE 5.3 Tischlerarbeiten 2 (Türen)	192 Tage	Mon 03.08.26	Fre 14.05.27		
362	Ausführung Tischler Türen Rückbau/Sicherung	5 Tage	Mon 03.08.26	Fre 07.08.26		
363	Ausführung Tischler Türen	10 Tage	Mon 03.05.27	Fre 14.05.27		
364	VE 5.4.2 Bodenbelag / Linoleum	45 Tage	Mon 15.03.27	Fre 14.05.27		
365	Ausführung Linoleum	35 Tage	Mon 15.03.27	Fre 30.04.27		
366	Sockelleisten	10 Tage	Mon 03.05.27	Fre 14.05.27		
367	VE 5.5 Metallbau 2 (Schlosser)	30 Tage	Mon 05.04.27	Fre 14.05.27		
368	Ausführung Schlosser Treppengeländer	30 Tage	Mon 05.04.27	Fre 14.05.27		
369	VE 5.6 Maler	40 Tage	Mon 03.05.27	Fre 25.06.27		
370	Ausführung Maler HT	40 Tage	Mon 03.05.27	Fre 25.06.27		
371	VE 5.7 Blendschutz	25 Tage	Mon 03.05.27	Fre 04.06.27		
372	Ausführung Blendschutz	25 Tage	Mon 03.05.27	Fre 04.06.27		
373	VE 5.7.1 Verdunkelung	15 Tage	Mon 05.04.27	Fre 23.04.27		
374	Verdunkelung	15 Tage	Mon 05.04.27	Fre 23.04.27		
375	VE 5.7. Blendschutz	25 Tage	Mon 03.05.27	Fre 04.06.27		
376	Ausführung Blendschutz	25 Tage	Mon 03.05.27	Fre 04.06.27		
377	VE 5.8 Decken (Eternit-Decken Aussenbereich)	90 Tage	Mon 26.04.27	Fre 27.08.27		
378	Deckenuntersichten HT, Verbindungsgänge	90 Tage	Mon 26.04.27	Fre 27.08.27		
379	VE 5.10.02 Instandsetzung Innenhofplatten	140 Tage	Mon 15.02.27	Fre 27.08.27		
380	Instandsetzung / Sanierung innenhofplatten	80 Tage	Mon 15.02.27	Fre 04.06.27		
381	Ausführung Einbau Innenhofplatten Atrium	90 Tage	Mon 26.04.27	Fre 27.08.27		
382	VE 5.10.03 Landschaftsbau / Sportplatzsanierung	205 Tage	Mon 01.03.27	Fre 10.12.27		
383	Ausführung Landschaftsbau f. Schulbetrieb	139 Tage	Mon 01.03.27	Don 09.09.27		
384	Ausführung Landschaftsbau Restarbeiten	66 Tage	Fre 10.09.27	Fre 10.12.27		
385	VE 5.11 Holzfenster	10 Tage	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26		
386	Ausführung Holzfenster	10 Tage	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26		
387	Ausstattung Klassenzimmer (GP)	272 Tage	Mon 03.08.26	Fre 03.09.27		
388	Abklemmarbeiten Physiksaaltische	2 Tage	Mon 03.08.26	Die 04.08.26		
389	Ausstattung Klassenzimmer (GP)	20 Tage	Mon 09.08.27	Fre 03.09.27		
390	VE 6.1 Beschilderung/Signaletik	15 Tage	Mon 31.05.27	Fre 18.06.27		
391	Ausführung Beschilderung	15 Tage	Mon 31.05.27	Fre 18.06.27		
392	VE 6.2 Baureinigung	20 Tage	Mon 21.06.27	Fre 16.07.27		
393	Ausführung Baureinigung	20 Tage	Mon 21.06.27	Fre 16.07.27		
394	Feuerlöschgeräte (GP)	5 Tage	Mon 05.07.27	Fre 09.07.27		
395	VE 5.5.02 Schließanlage	5 Tage	Mon 05.07.27	Fre 09.07.27		
396	Nutzertechnik, IT-Technik Fachbereich GP	20 Tage	Mon 07.06.27	Fre 02.07.27		
397	BRA Vorbegehung	1 Tag	Fre 16.07.27	Fre 16.07.27		
398	Abnahmen, Mängelbeseitigung	19 Tage	Mon 19.07.27	Don 12.08.27		
399	BRA Abnahme	1 Tag	Fre 13.08.27	Fre 13.08.27		
400	Puffer	19 Tage	Mon 16.08.27	Don 09.09.27		
401	Übergabe an Nutzer	1 Tag	Fre 10.09.27	Fre 10.09.27		
402	Umzug Schule von Interim zu Südtrakt	10 Tage	Mon 13.09.27	Fre 24.09.27		

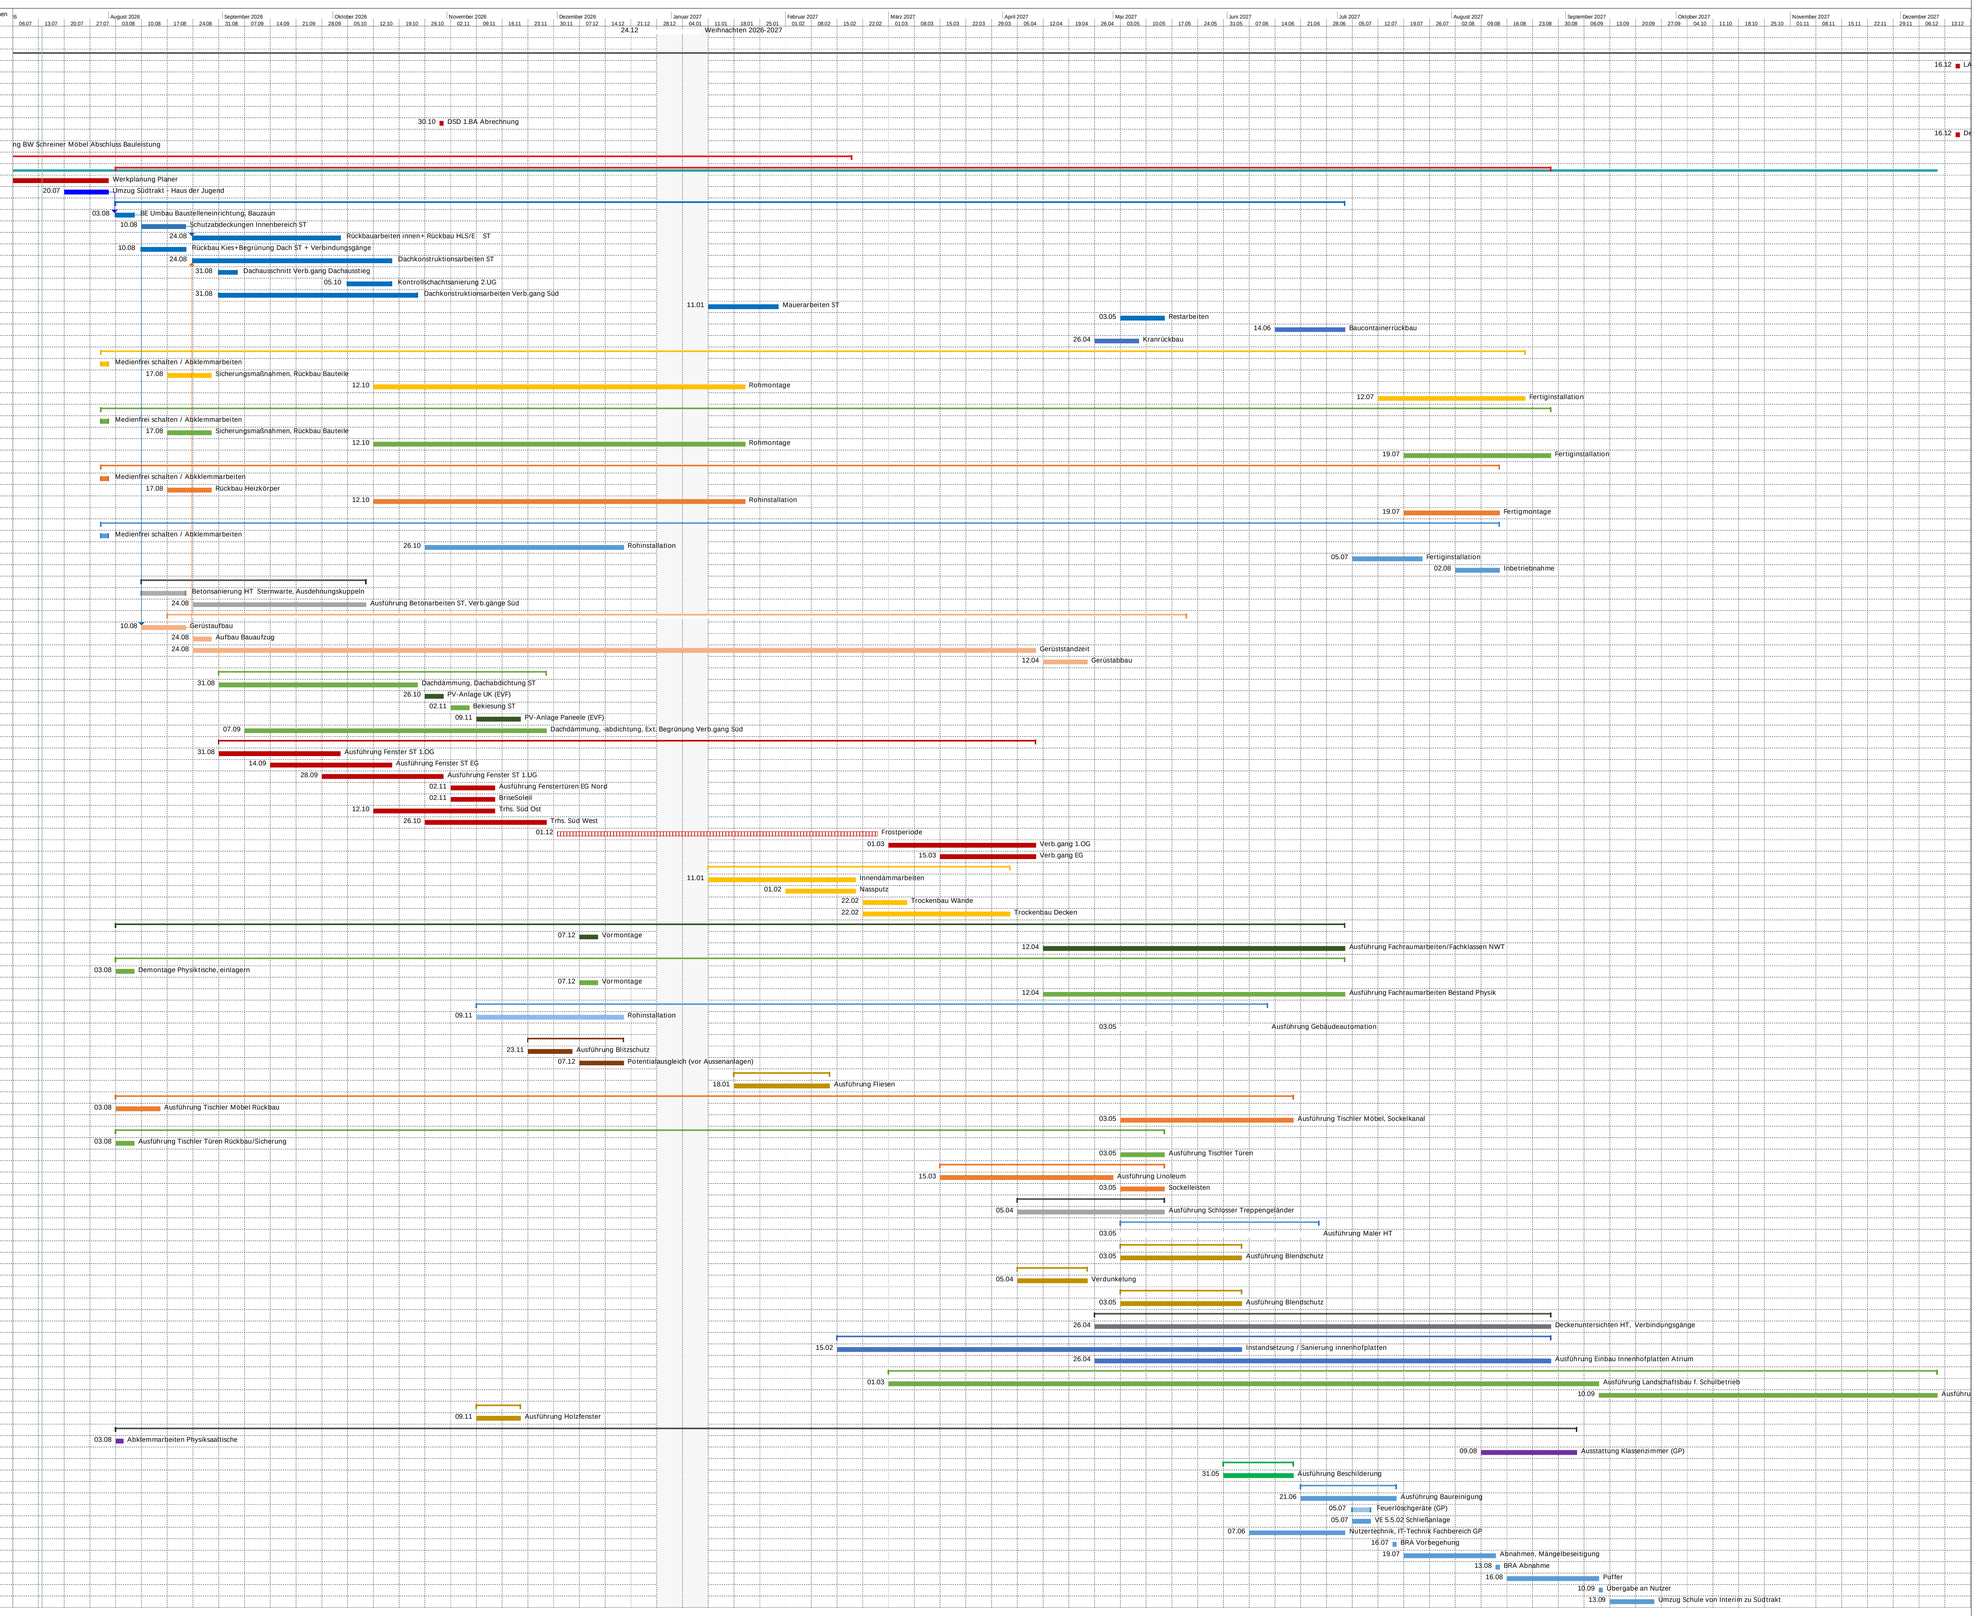

Projekt: 241001_HoGy_Gewerk
Datum: Die 14.07.26

Vorgang · Unterbrechung · Meilenstein · Sammelvorgang · Projektsammelvorgang · Inaktiver Vorgang · Inaktiver Meilenstein · Inaktiver Sammelvorgang · Manueller Vorgang · Nur Dauer · Manueller Sammelrollup · Manueller Sammelvorgang · Nur Anfang · Nur Ende · Externe Vorgänge · Externer Meilenstein · Stichtag · Im Arbeit · Manueller Fortschritt
