Generalsanierung
Hohenstaufen-
Gymnasium

Bauabschnitt 2

dasch zürn + partner
Index 01/[Die 14.07.26atum]/dzpa

Rahmenterminplan BA2

Nr.	Vorgangsr	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
1		Weihnachten 2026-2027	1 Tag	Don 24.12.26	Fre 08.01.27		
2		Weihnachten 2027-2028	1 Tag	Die 01.10.24	Die 01.10.24		
3		Fördertermine Fristen	928 Tage	Don 30.04.26	Mon 24.12.29		
4		LAD 1.BA Abschluss Bauleistung	1 Tag	Don 16.12.27	Don 16.12.27		
5		LAD 1.BA Abrechnung	1 Tag	Fre 22.12.28	Fre 22.12.28		
6		LAD 2.BA Abschluss Bauleistung	1 Tag	Fre 05.05.28	Fre 05.05.28		
7		LAD 2.BA Abrechnung	1 Tag	Mon 24.12.29	Mon 24.12.29		
8		DSD 1.BA Abschluss Bauleistung	1 Tag	Don 30.04.26	Don 30.04.26		
9		DSD 1.BA Abrechnung	1 Tag	Fre 30.10.26	Fre 30.10.26		
10		Denkmalschutz-Sonderprogramm XI 1.+2.BA Abrechnung	1 Tag	Don 16.12.27	Don 16.12.27		
11		Dt. Stiftung BW Schreiner Möbel Abschluss Bauleistung	1 Tag	Fre 26.06.26	Fre 26.06.26		
12		1.Bauabschnitt	387 Tage	Mon 21.07.25	Don 18.02.27		
277		2.Bauabschnitt Südtrakt	267 Tage	Mon 03.08.26	Fre 27.08.27		
278		Werkplanung Planer	100 Tage	Mon 16.03.26	Fre 31.07.26		
279		Umzug Südtrakt - Haus der Jugend	10 Tage	Mon 20.07.26	Fre 31.07.26		
280		VE 3.1.01 Rohbau	227 Tage	Mon 03.08.26	Fre 02.07.27		
281		BE Umbau Baustelleneinrichtung, Bauzaun	5 Tage	Mon 03.08.26	Fre 07.08.26	279	
282		Schutzabdeckungen Innenbereich ST	10 Tage	Mon 10.08.26	Fre 21.08.26		
283		Rückbauarbeiten innen+ Rückbau HLS/E ST	30 Tage	Mon 24.08.26	Fre 02.10.26	282	
284		Rückbau Kies+Begrünung Dach ST + Verbindungsgänge	10 Tage	Mon 10.08.26	Fre 21.08.26		
285		Dachkonstruktionsarbeiten ST	40 Tage	Mon 24.08.26	Fre 16.10.26	317	
286		Dachausschnitt Verb.gang Dachausstieg	5 Tage	Mon 31.08.26	Fre 04.09.26		
287		Kontrollschachtsanierung 2.UG	10 Tage	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26		
288		Dachkonstruktionsarbeiten Verb.gang Süd	40 Tage	Mon 31.08.26	Fre 23.10.26		
289		Mauerarbeiten ST	15 Tage	Mon 11.01.27	Fre 29.01.27		
290		Restarbeiten	10 Tage	Mon 03.05.27	Fre 14.05.27		
291		Baucontainerrückbau	15 Tage	Mon 14.06.27	Fre 02.07.27		
292		Kranrückbau	10 Tage	Mon 26.04.27	Fre 07.05.27		
293		VE 3.2.01 ELT / Daten	264 Tage	Don 30.07.26	Fre 20.08.27		
294		Medienfrei schalten / Abklemmarbeiten	2 Tage	Don 30.07.26	Fre 31.07.26		
295		Sicherungsmaßnahmen, Rückbau Bauteile	10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26		
296		Rohmontage	60 Tage	Mon 12.10.26	Mit 20.01.27		
297		Fertiginstallation	30 Tage	Mon 12.07.27	Fre 20.08.27		
298		VE 3.2.02 Sanitär	269 Tage	Don 30.07.26	Fre 27.08.27		
299		Medienfrei schalten / Abklemmarbeiten	2 Tage	Don 30.07.26	Fre 31.07.26		
300		Sicherungsmaßnahmen, Rückbau Bauteile	10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26		
301		Rohmontage	60 Tage	Mon 12.10.26	Mit 20.01.27		
302		Fertiginstallation	30 Tage	Mon 19.07.27	Fre 27.08.27		
303		VE 3.2.03 Heizung	259 Tage	Don 30.07.26	Fre 13.08.27		
304		Medienfrei schalten / Abklemmarbeiten	2 Tage	Don 30.07.26	Fre 31.07.26		
305		Rückbau Heizkörper	10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26		
306		Rohinstallation	60 Tage	Mon 12.10.26	Mit 20.01.27		
307		Fertigmontage	20 Tage	Mon 19.07.27	Fre 13.08.27		
308		VE 3.2.04 Lüftung	259 Tage	Don 30.07.26	Fre 13.08.27		
309		Medienfrei schalten / Abklemmarbeiten	2 Tage	Don 30.07.26	Fre 31.07.26		
310		Rohinstallation	40 Tage	Mon 26.10.26	Fre 18.12.26		
311		Fertiginstallation	15 Tage	Mon 05.07.27	Fre 23.07.27		
312		Inbetriebnahme	10 Tage	Mon 02.08.27	Fre 13.08.27		
313		VE 4.1 Betonarbeiten (Sichtbetonsanierung)	45 Tage	Mon 10.08.26	Fre 09.10.26		
314		Betonsanierung HT Sternwarte, Ausdehnungskuppeln	10 Tage	Mon 10.08.26	Fre 21.08.26		
315		Ausführung Betonarbeiten ST, Verb.gänge Süd	35 Tage	Mon 24.08.26	Fre 09.10.26		
316		VE 4.2 Gerüst	186 Tage	Mon 17.08.26	Don 20.05.27		
317		Gerüstaufbau	10 Tage	Mon 10.08.26	Fre 21.08.26	281	
318		Aufbau Bauaufzug	5 Tage	Mon 24.08.26	Fre 28.08.26		
319		Gerüststandzeit	152 Tage	Mon 24.08.26	Fre 09.04.27		
320		Gerüstabbau	10 Tage	Mon 12.04.27	Fre 23.04.27		
321		VE 4.3 Dacharbeiten	65 Tage	Mon 31.08.26	Fre 27.11.26		
322		Dachdämmung, Dachabdichtung ST	40 Tage	Mon 31.08.26	Fre 23.10.26		
323		PV-Anlage UK (EVF)	5 Tage	Mon 26.10.26	Fre 30.10.26		
324		Bekiesung ST	5 Tage	Mon 02.11.26	Fre 06.11.26		
325		PV-Anlage Paneele (EVF)	10 Tage	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26		
326		Dachdämmung, -abdichtung, Ext. Begrünung Verb.gang Süd	60 Tage	Mon 07.09.26	Fre 27.11.26		
327		VE 4.4 Fassadenarbeiten	147 Tage	Mon 31.08.26	Fre 09.04.27		
328		Ausführung Fenster ST 1.OG	25 Tage	Mon 31.08.26	Fre 02.10.26		
329		Ausführung Fenster ST EG	25 Tage	Mon 14.09.26	Fre 16.10.26		
330		Ausführung Fenster ST 1.UG	25 Tage	Mon 28.09.26	Fre 30.10.26		
331		Ausführung Fenstertüren EG Nord	10 Tage	Mon 02.11.26	Fre 13.11.26		
332		BriseSoleil	10 Tage	Mon 02.11.26	Fre 13.11.26		
333		Trhs. Süd Ost	25 Tage	Mon 12.10.26	Fre 13.11.26		
334		Trhs. Süd West	25 Tage	Mon 26.10.26	Fre 27.11.26		
335		Frostperiode	50 Tage	Die 01.12.26	Don 25.02.27		
336		Verb.gang 1.OG	30 Tage	Mon 01.03.27	Fre 09.04.27		
337		Verb.gang EG	20 Tage	Mon 15.03.27	Fre 09.04.27		
338		VE 4.6 Trockenbau (Innendämmung, -putz)	60 Tage	Mon 11.01.27	Fre 02.04.27		
339		Innendämmarbeiten	30 Tage	Mon 11.01.27	Fre 19.02.27		
340		Nassputz	15 Tage	Mon 01.02.27	Fre 19.02.27		
341		Trockenbau Wände	10 Tage	Mon 22.02.27	Fre 05.03.27		
342		Trockenbau Decken	30 Tage	Mon 22.02.27	Fre 02.04.27		
343		VE 5.9.1 Fachraumarbeiten/Fachklassenausstattung NWT	227 Tage	Mon 03.08.26	Fre 02.07.27		
344		Vormontage	5 Tage	Mon 07.12.26	Fre 11.12.26		
345		Ausführung Fachraumarbeiten/Fachklassen NWT	60 Tage	Mon 12.04.27	Fre 02.07.27		
346		VE 5.9.2 Fachraumarbeiten Bestandseinrichtung Physik	227 Tage	Mon 03.08.26	Fre 02.07.27		
347		Demontage Physiktische, einlagern	5 Tage	Mon 03.08.26	Fre 07.08.26		
348		Vormontage	5 Tage	Mon 07.12.26	Fre 11.12.26		
349		Ausführung Fachraumarbeiten Bestand Physik	60 Tage	Mon 12.04.27	Fre 02.07.27		
350		VE 4.8 Gebäudeautomation	142 Tage	Mon 09.11.26	Fre 11.06.27		
351		Rohinstallation	30 Tage	Mon 09.11.26	Fre 18.12.26		
352		Ausführung Gebäudeautomation	30 Tage	Mon 03.05.27	Fre 11.06.27		
353		VE 4.9 Blitzschutz	20 Tage	Mon 23.11.26	Fre 18.12.26		
354		Ausführung Blitzschutz	10 Tage	Mon 23.11.26	Fre 04.12.26		
355		Potentialausgleich (vor Aussenanlagen)	10 Tage	Mon 07.12.26	Fre 18.12.26		
356		VE 5.1 Fliesen-/Plattenarbeiten	20 Tage	Mon 18.01.27	Fre 12.02.27		
357		Ausführung Fliesen	20 Tage	Mon 18.01.27	Fre 12.02.27		
358		VE 5.2 Tischlerarbeiten 1 (Möbel)	217 Tage	Mon 03.08.26	Fre 18.06.27		
359		Ausführung Tischler Möbel Rückbau	10 Tage	Mon 03.08.26	Fre 14.08.26		
360		Ausführung Tischler Möbel, Sockelkanal	35 Tage	Mon 03.05.27	Fre 18.06.27		
361		VE 5.3 Tischlerarbeiten 2 (Türen)	192 Tage	Mon 03.08.26	Fre 14.05.27		
362		Ausführung Tischler Türen Rückbau/Sicherung	5 Tage	Mon 03.08.26	Fre 07.08.26		
363		Ausführung Tischler Türen	10 Tage	Mon 03.05.27	Fre 14.05.27		
364		VE 5.4.2 Bodenbelag / Linoleum	45 Tage	Mon 15.03.27	Fre 14.05.27		
365		Ausführung Linoleum	35 Tage	Mon 15.03.27	Fre 30.04.27		
366		Sockelleisten	10 Tage	Mon 03.05.27	Fre 14.05.27		
367		VE 5.5 Metallbau 2 (Schlosser)	30 Tage	Mon 05.04.27	Fre 14.05.27		
368		Ausführung Schlosser Treppengeländer	30 Tage	Mon 05.04.27	Fre 14.05.27		
369		VE 5.6 Maler	40 Tage	Mon 03.05.27	Fre 25.06.27		
370		Ausführung Maler HT	40 Tage	Mon 03.05.27	Fre 25.06.27		
371		VE 5.7 Blendschutz	25 Tage	Mon 03.05.27	Fre 04.06.27		
372		Ausführung Blendschutz	25 Tage	Mon 03.05.27	Fre 04.06.27		
373		VE 5.7.1 Verdunkelung	15 Tage	Mon 05.04.27	Fre 23.04.27		
374		Verdunkelung	15 Tage	Mon 05.04.27	Fre 23.04.27		
375		VE 5.7. Blendschutz	25 Tage	Mon 03.05.27	Fre 04.06.27		
376		Ausführung Blendschutz	25 Tage	Mon 03.05.27	Fre 04.06.27		
377		VE 5.8 Decken (Eternit-Decken Aussenbereich)	90 Tage	Mon 26.04.27	Fre 27.08.27		
378		Deckenuntersichten HT, Verbindungsgänge	90 Tage	Mon 26.04.27	Fre 27.08.27		
379		VE 5.10.02 Instandsetzung Innenhofplatten	140 Tage	Mon 15.02.27	Fre 27.08.27		
380		Instandsetzung / Sanierung Innenhofplatten	80 Tage	Mon 15.02.27	Fre 04.06.27		
381		Ausführung Einbau Innenhofplatten Atrium	90 Tage	Mon 26.04.27	Fre 27.08.27		
382		VE 5.10.03 Landschaftsbau / Sportplatzsanierung	205 Tage	Mon 01.03.27	Fre 10.12.27		
383		Ausführung Landschaftsbau f. Schulbetrieb	139 Tage	Mon 01.03.27	Don 09.09.27		
384		Ausführung Landschaftsbau Restarbeiten	66 Tage	Fre 10.09.27	Fre 10.12.27		
385		VE 5.11 Holzfenster	10 Tage	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26		
386		Ausführung Holzfenster	10 Tage	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26		
387		Ausstattung Klassenzimmer (GP)	272 Tage	Mon 03.08.26	Fre 03.09.27		
388		Abklemmarbeiten Physiksaaltische	2 Tage	Mon 03.08.26	Die 04.08.26		
389		Ausstattung Klassenzimmer (GP)	20 Tage	Mon 09.08.27	Fre 03.09.27		
390		VE 6.1 Beschilderung/Signaletik	15 Tage	Mon 31.05.27	Fre 18.06.27		
391		Ausführung Beschilderung	15 Tage	Mon 31.05.27	Fre 18.06.27		
392		VE 6.2 Baureinigung	20 Tage	Mon 21.06.27	Fre 16.07.27		
393		Ausführung Baureinigung	20 Tage	Mon 21.06.27	Fre 16.07.27		
394		Feuerlöschgeräte (GP)	5 Tage	Mon 05.07.27	Fre 09.07.27		
395		VE 5.5.02 Schließanlage	5 Tage	Mon 05.07.27	Fre 09.07.27		
396		Nutzertechnik, IT-Technik Fachbereich GP	20 Tage	Mon 07.06.27	Fre 02.07.27		
397		BRA Vorbegehung	1 Tag	Fre 16.07.27	Fre 16.07.27		
398		Abnahmen, Mängelbeseitigung	19 Tage	Mon 19.07.27	Don 12.08.27		
399		BRA Abnahme	1 Tag	Fre 13.08.27	Fre 13.08.27		
400		Puffer	19 Tage	Mon 16.08.27	Don 09.09.27		
401		Übergabe an Nutzer	1 Tag	Fre 10.09.27	Fre 10.09.27		
402		Umzug Schule von Interim zu Südtrakt	10 Tage	Mon 13.09.27	Fre 24.09.27		

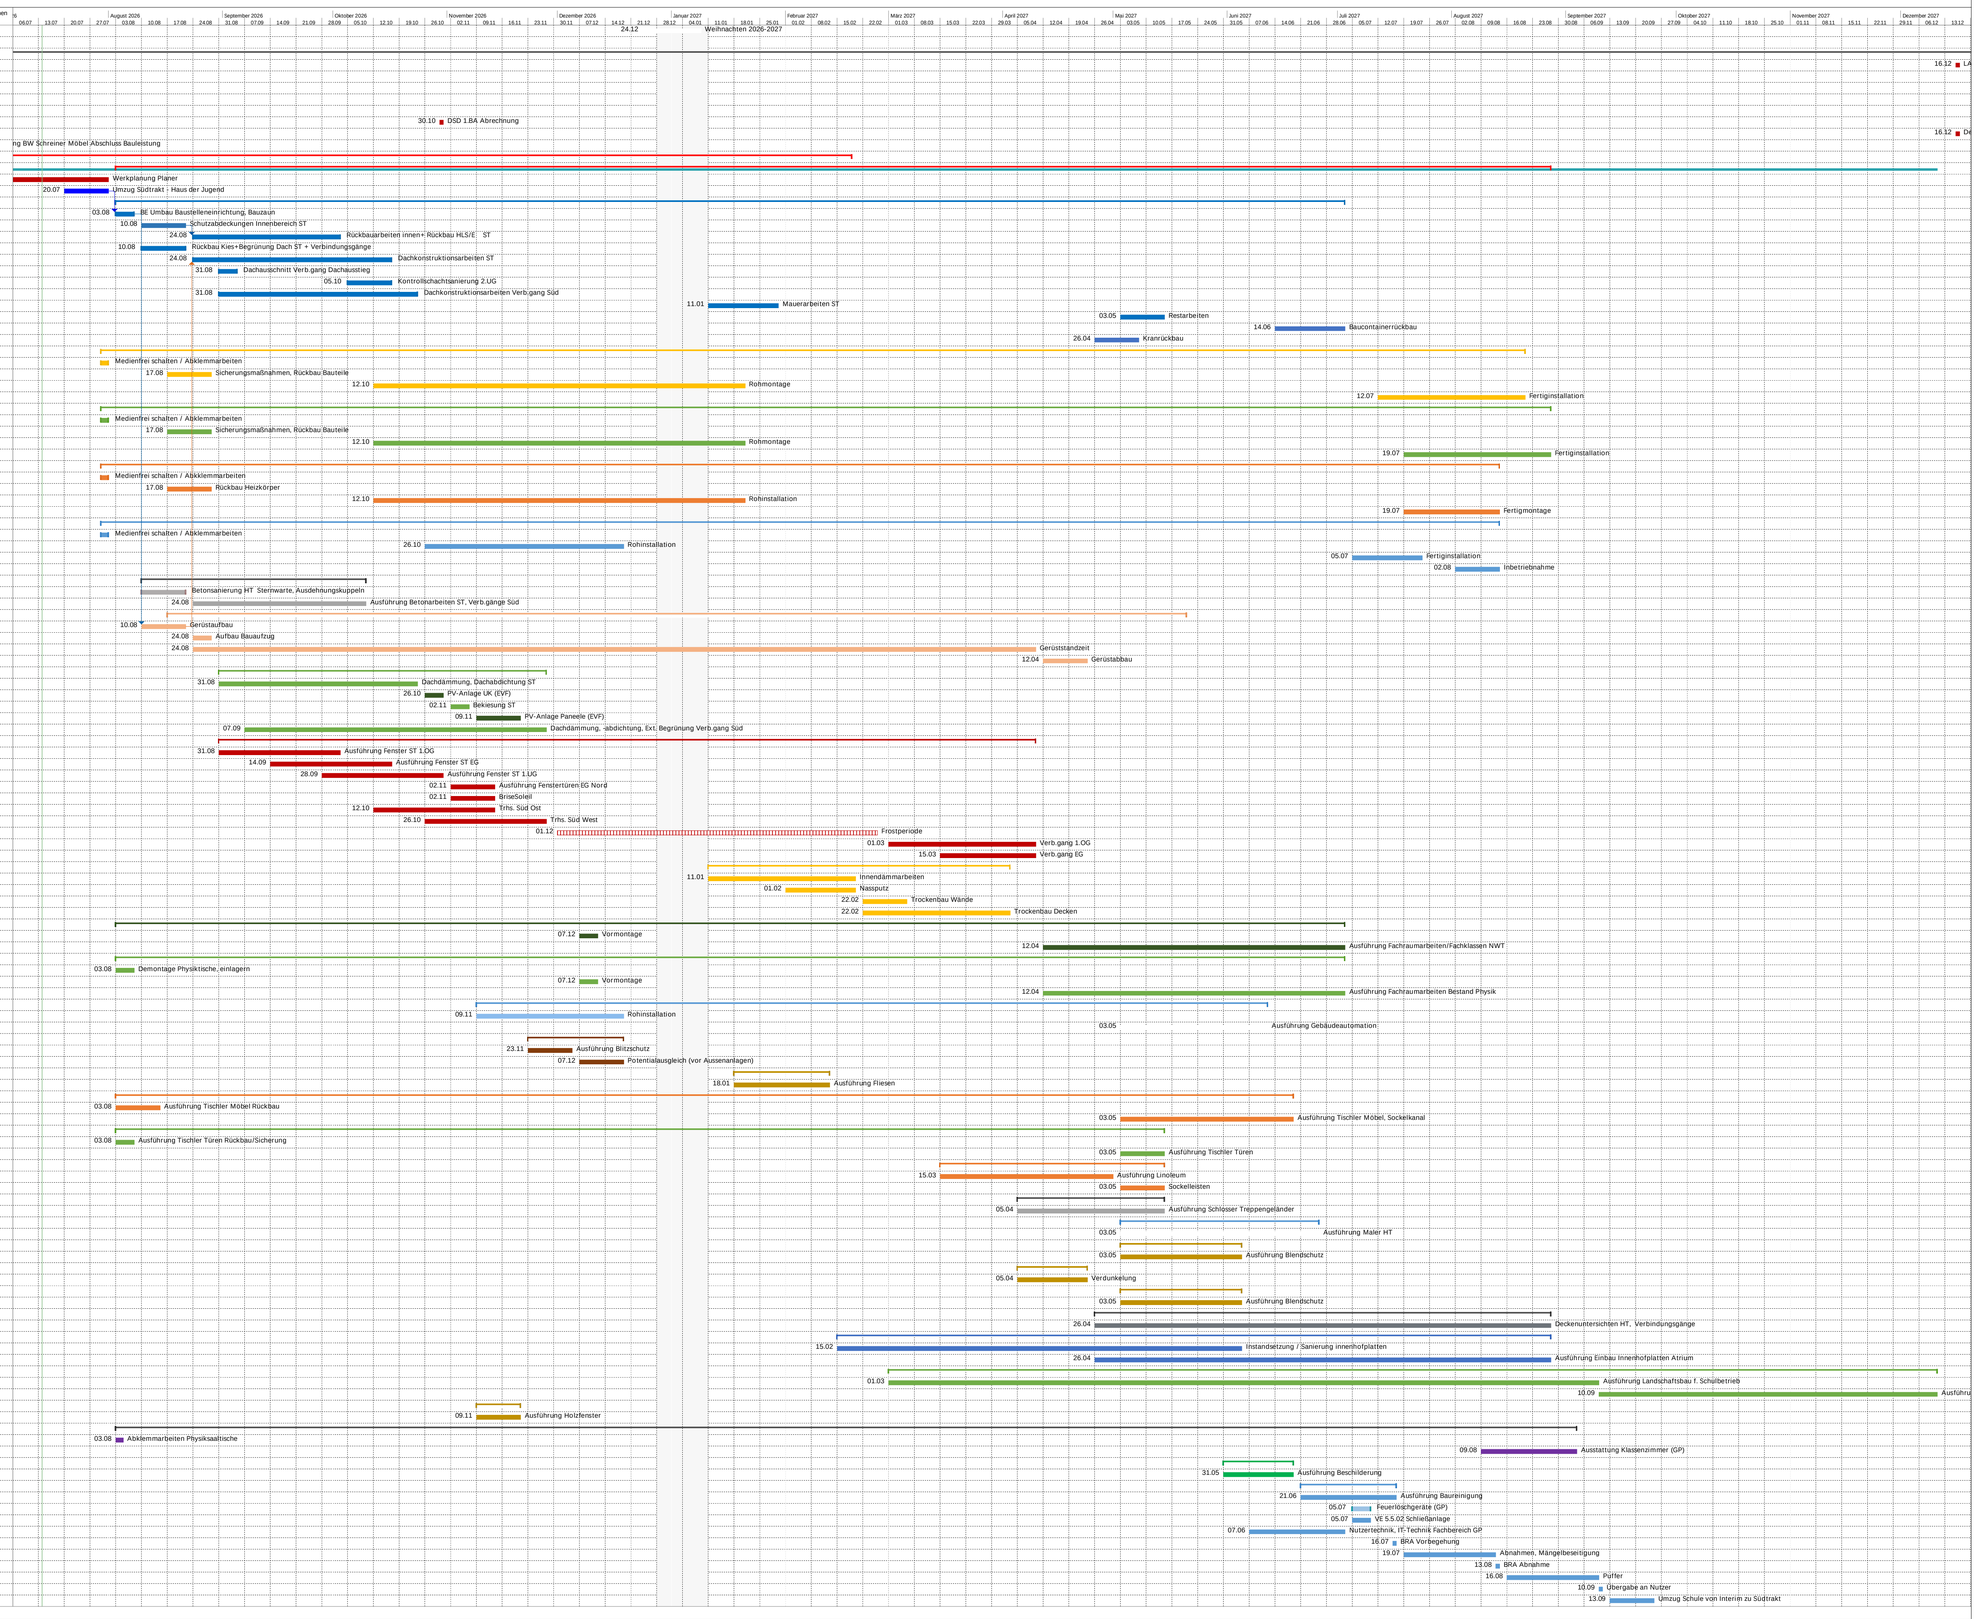

Projekt: 241001_HoGy_Gewerk
Datum: Die 14.07.26

Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelrollup | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Stichtag | Im Arbeit | Manueller Fortschritt
